

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Estructura de desglose del trabajo

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

21 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Diagrama de la estructura	1
4. Diccionario de la estructura (Paquetes principales)	3
5. Conclusión	3

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Estructura de desglose del trabajo
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha	21 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento contiene la Estructura de desglose del trabajo del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Esta estructura es una descomposición jerárquica orientada a los entregables que el equipo de proyecto ejecutará para cumplir los objetivos y crear los productos requeridos.

La Estructura de desglose del trabajo permite definir el alcance total del proyecto dividiendo el trabajo en paquetes manejables y fácilmente asignables. Al tratarse de un prototipo Front-End navegable acompañado de un conjunto de documentos de gestión académica, esta estructura se organiza en grandes fases que coinciden con los grupos de procesos y el desarrollo técnico, finalizando con la integración y el cierre.

3. Diagrama de la estructura

A continuación, se presenta de manera gráfica la Estructura de desglose del trabajo. Debido al nivel de detalle y la extensión del diagrama, este se expone en formato de página horizontal en la página siguiente, utilizando una exportación vectorial desde la herramienta original de modelado para garantizar que todos los textos sean legibles.

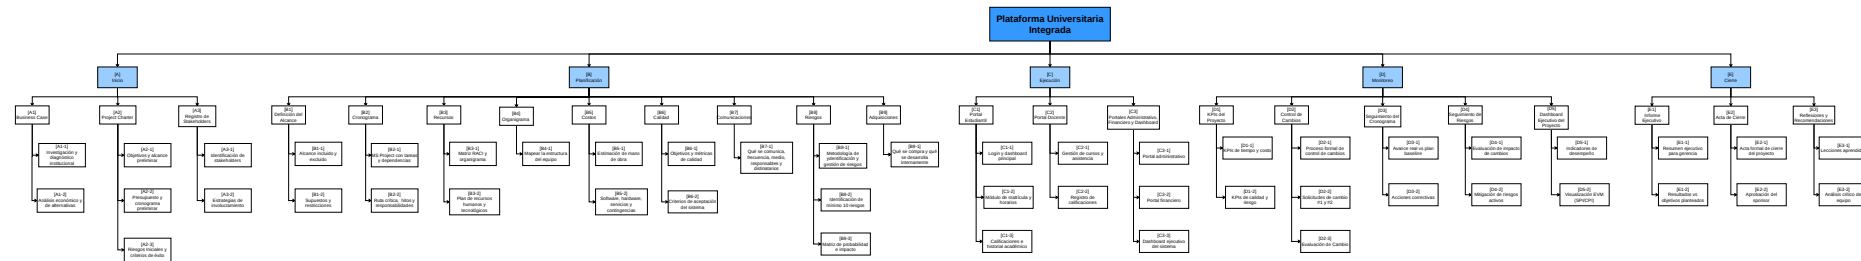


Figura 1: Estructura de desglose del trabajo - Plataforma Universitaria Integrada

4. Diccionario de la estructura (Paquetes principales)

Para complementar el diagrama anterior y satisfacer el requerimiento de documentar criterios de aceptación, a continuación se describen los paquetes de trabajo más importantes del proyecto. Estos criterios garantizan que cada porción del trabajo alcance el estándar de calidad definido.

Tabla 1: Diccionario de la Estructura de desglose del trabajo y criterios de aceptación

Paquete de Trabajo		Criterios de Aceptación
Documentación de Planificación	de	Los 17 documentos iniciales deben estar aprobados, contener la información mínima solicitada y utilizar formato uniforme en LaTeX.
Portal Estudiantil		El módulo debe permitir navegación simulada de matrícula, consulta de notas y estados de cuenta, cumpliendo los principios de diseño UX aprobados.
Portal Docente		El módulo debe mostrar pantallas funcionales visualmente para registrar asistencia y calificaciones, aunque sin persistencia de base de datos.
Portal Financiero		El módulo debe evidenciar el flujo visual del pago de matrícula y cursos con simulaciones interactivas.
Dashboard Ejecutivo		El módulo debe estar integrado al prototipo y también ser entregado de manera automatizada como un archivo Excel (Entregable 23).
Integración y Pruebas		Todos los portales deben estar unidos bajo un menú de navegación claro. Debe evaluarse con usuarios simulados sin generar errores visuales graves.
Documentación de Cierre	de	Los documentos de evaluación, recomendaciones e informe ejecutivo deben estar alineados con el cronograma y presupuesto final.

5. Conclusión

La estructuración del alcance a través de la Estructura de desglose del trabajo garantiza que todo el esfuerzo del equipo está debidamente delimitado y justificado. Al organizar el trabajo en paquetes relacionados con la gestión (metodología PMI) y la ejecución técnica (desarrollo Front-End), el equipo logra tener una hoja de ruta clara que previene el alcance creciente y permite dar seguimiento oportuno al avance de los entregables individuales.
